

空港绿地新城四期项目进度（8月22日）

1 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，防火门扇安装完成60%，外保温完成，外墙真石漆完成92%，一体板完成92%，屋面瓦完成，吊顶完成，乳胶漆完成70%，贴砖完成，卧室地面找平完成，新风安装完成，进户门安装完成，橱柜浴室柜淋浴屏安装完成80%，户内门安装完成50%，空调安装完成20%。



6 号楼（15F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成95%，屋面瓦完成，玻璃完成97%，墙地砖完成，新风安装完成，吊顶完成，腻子完成，乳胶漆完成90%，卧室地面找平完成，橱柜、浴室柜安装完成，户内门安装完成80%，进户门安装完成，淋浴屏安装完成，空调安装完成50%。



9 号楼（17F）

外保温完成，外墙真石漆完成92%，
防火门框安装完成，屋面瓦完成，一体
板完成96%，玻璃安装完成90%，墙体找平
完成，吊顶完成90%，墙地砖铺贴完成90%，
新风安装完成，户内门上楼。



12 号楼（17F）

玻璃安装完成90%，外墙保温完成，真石
漆完成95%，一体板完成95%，屋面瓦完成，
墙地砖完成，吊顶完成，乳胶漆完成80%，
地面找平完成，新风系统安装完成，进户
门安装完成，橱柜浴室柜安装完成40%，
淋浴屏安装完成50%，户内门安装完成40%。




14 号楼（18F）

外墙真石漆完成95%，一体板完成，乳
胶漆完成，玻璃安装完成，橱柜、浴室
柜完成，户内门安装完成，空调安装完成，
木地板安装完成，新风安装完成，淋浴屏
安装完成，进户门安装完成，精保洁完成95%。



15 号楼（18F）

玻璃安装完成90%，外保温完成95%，
外墙真石漆完成90%，屋面瓦完成，
墙体找平完成，吊顶完成85%，地面
找平完成95%，墙地面贴砖完成85%，
橱柜浴室柜进场上楼。

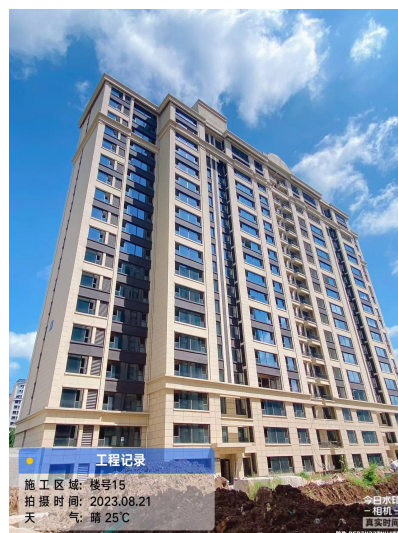

16 号楼（17F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，
一体板完成95%，新风系统安装完成，
吊顶完成，墙面找平完成，玻璃安
装完成，地砖完成，腻子完成，
乳胶漆完成，屋面瓦完成，橱柜
浴室柜安装完成，户内门安装完成，
淋浴屏安装完成，木地板完成，进
户门安装完成，精保洁完成95%。



室外

土方回填完成，围墙完成，小市政完成95%，二批次景观扑救面完成90%，铺装完成70%，地形完成80%，绿化完成40%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成92%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成90%。

