

一、空港绿地新城四期项目施工进度公示（8月）

1 号楼（15F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成40%。



2 号楼（6F）

主体结构封顶。室内砌体完成95%，抹灰完成95%，窗框栏杆安装完成。




3 号楼（6F）

主体结构封顶。室内砌体完成 92%，抹灰完成 92%，窗框栏杆安装完成。




4 号楼（6F）

主体结构封顶。室内砌体完成 92%，抹灰完成 92%，窗框栏杆安装完成，外保温完成 15%

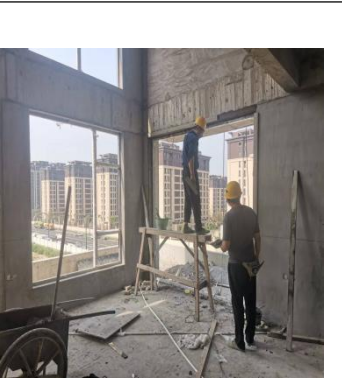

5 号楼（6F）

主体结构封顶。室内砌体完成 92%，抹灰完成 92%，窗框、栏杆安装完成。

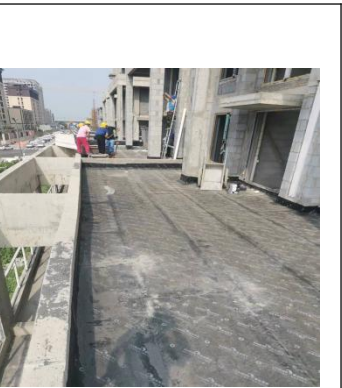


6 号楼（15F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框安装完成，外墙保温完成 50%。



7 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 90%，外墙涂料完成 30%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装施工完成 60%。

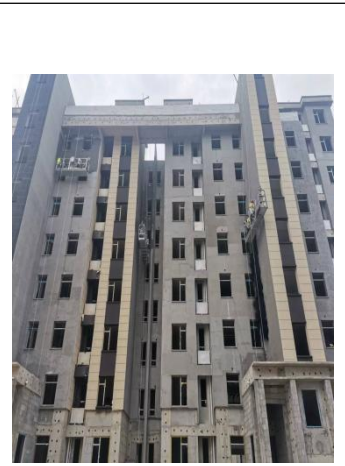


8 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 90%，外墙涂料完成 30%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成 60%




9 号楼（17F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成 60%，窗框安装完成。

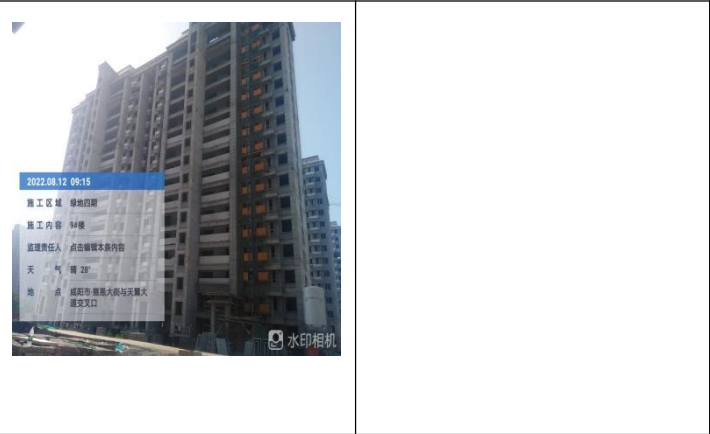

10 号楼（8+1F）

主体结构封顶。室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成 40%，屋面防水完成

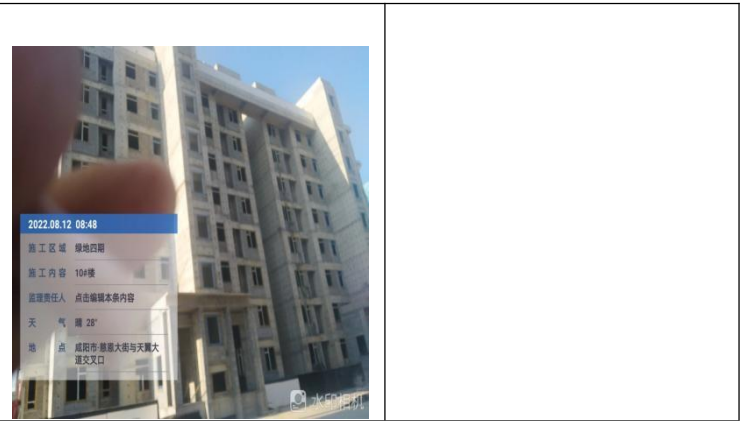

11 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 90%，外墙涂料完成 30%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成



12 号楼（17F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成 60%。




13 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 65%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成、地暖完成，精装修完成 30%



14 号楼（18F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成 80%，窗框安装完成，外墙保温完成 70%，外墙涂料开始施工

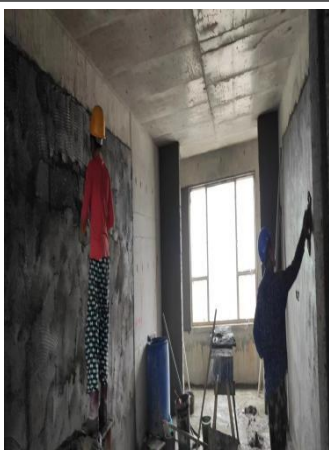

15 号楼（18F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，窗框安装完成 50%。



16 号楼（17F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成 80%，窗框安装完成，外墙保温完成 70%，外墙涂料开始施工。



室外:

土方回填完成 20%，围墙完成 40%，小市政单位进场



地下：

地库主体完成，砌体完成 70%，
安装完成 65%，装饰完成 30%

