

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



2 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成95%，
首层地坪完成，外墙保温完成30%



3 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成92%，
窗框栏杆安装完成，首层地坪完成，
外墙保温完成30%



4 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成92%，
窗框栏杆安装完成，首层地坪浇筑完成
外保温完成50%



5 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成92%，
窗框、栏杆安装完成，首层地坪浇筑完成
外墙保温完成90%



6 号楼（15F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框
安装完成，外墙保温完成65%，新风系
统安装，电梯安装、卫生间防水完成，给
水完成70%




7 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成87%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装施工完成75%



8 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成86%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装完成80%

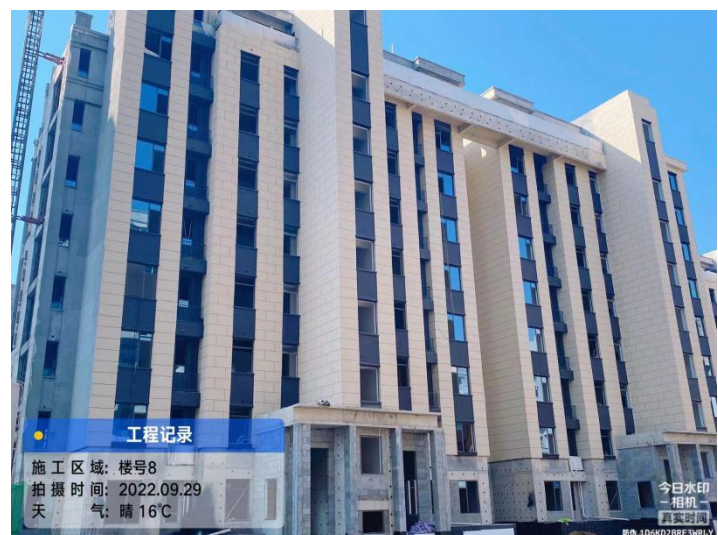

9 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，
窗框安装完成，吊篮安装完成，电
梯安装



10 号楼 (8+1F)

室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成60%，外墙保温完成60%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成78%，室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成30%



12 号楼 (17F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，给水完成80%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成90%，外墙涂料完成60%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装修完成50%



14 号楼（18F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，
窗框安装完成，外墙保温完成75%，
外墙涂料完成45%，室内给水完成，
地暖完成，精装进场



15 号楼（18F）

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙
抹灰完成，给水完成70%



16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，
窗框安装完成，外墙保温完成80%，
外墙涂料完成50%，室内给水完成，
地暖完成70%，新风系统安装完成，
精装完成12%



室外

土方回填完成50%，围墙完成60%，
小市政完成5%、景观单位做景观围墙



地下

车库主体完成，砌体完成90%，
抹灰完成70%，安装完成72%，
装饰完成70%，地坪施工完成25%

