

空港绿地新城五期项目进度（12月30日）


1 号楼（15F）

室内砌体完成,窗框安装完成,外保温完成50%,玻璃排产中



2 号楼（8+1F）

外保温完成,真石漆完成95%,精装完成60%,玻璃安装完成

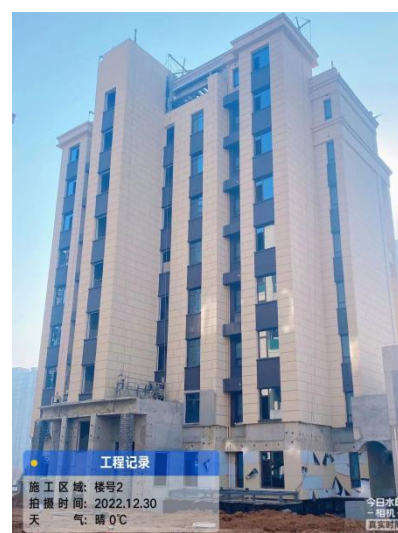

3 号楼（8+1F）

屋面防水完成,外保温完成90%,真石漆完成80%,玻璃安装完成



4 号楼（8+1F）

外墙保温完成90%，真石漆完成85%，精
装完成50%，玻璃安装完成



5 号楼（8+1F）

精装完成80%，外保温完成，真石漆
完成90%



6 号楼（15F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管完
成，内粉完成70%，栏杆完成



7 号楼 (8+1F)

精装完成80%，外立面完成80%，玻璃安
装完成



8 号楼 (8+1F)

精装完成90%，外立面完成95%，玻璃
安装完成



9 号楼 (8+1F)

精装完成80%，外立面完成70%



10 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，墙面找平开始



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶完成80%，外立面完成70%，玻璃安装完成



12 号楼 (8+1F)

精装完成70%，外立面完成80%，玻璃安装完成



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水
二遍完成，内粉完成30%，栏杆完成40%



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成95%，屋面防水
二遍完成，内粉完成50%，栏杆完成40%



15 号楼（8+1F）

精装完成60%，外立面完成80%，栏杆
安装完成



16 号楼（8+1F）

精装完成70%，外立面完成60%，栏杆
安装完成



17 号楼（8+1F）

构造柱完成，内粉完成，配管完成，
地暖保护层浇筑完成



18 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成85%



19 号楼（8+1F）

粉刷完成，室内防水完成，地暖保护层完成，移交精装



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，栏杆安装完成



21 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成20%，栏杆安装完成40%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
内粉完成10%



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成



车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成60%，
保护层浇筑完成50%，回填土完成45%，
小市政完成30%，景观完成10%

