

空港绿地新城六期项目进度（2月20日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成80%，涂料完成40%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，室内精装修完成75%，室内淋浴隔断完成，橱柜浴室柜完成90%



3 号楼（15F）

外立面保温、涂料完成96%，一体板完成85%，首层大堂精装修完成，标准层精装修完成48%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成70%，
涂料完成20%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成，
室内腻子打磨完成，室内淋浴隔
断完成，橱柜浴室柜完成90%



6号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，室内
精装完成75%，室内淋浴隔断完成，橱
柜浴室柜完成40%



7 号楼（16F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，
室内精装墙地砖、腻子完成，入户门
安装完成



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成60%，涂
料完成15%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内精装贴砖完成，淋浴隔断完成60%



10 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内精装墙地砖完成，淋浴隔断完成



11 号楼（16F）

外墙保温完成98%，涂料完成95%，一
体板完成80%，室内墙地砖完成90%



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室内
公区吊顶完成，墙面粉刷石膏完成80%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成85%，
室内墙面找平完成，公区吊顶
完成，地砖完成40%



14 号楼（15F）

外墙保温完成65%，室内精装吊顶完成，
墙面腻子完成



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成73%，
室内墙面粉刷、石膏找平完成90%




16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内墙面找平完成，公区地砖完成10%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成38%，室内
电梯安装完成

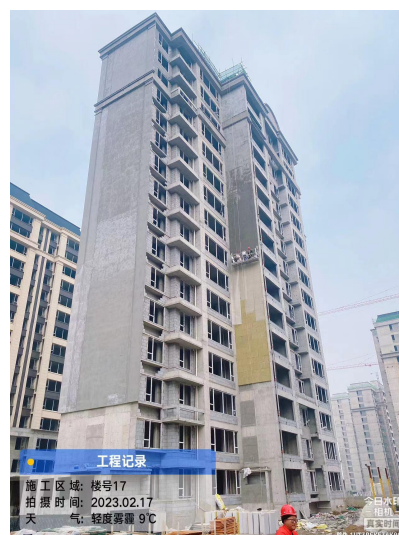

18 号楼（16F）

窗框安装完成，室内精装吊顶完成，
墙面腻子完成60%，室内电梯安装完成



19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成70%，室内精装修完成45%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成75%，室内精装完成20%，电梯安装完成



21 号楼（15F）

窗框安装完成30%，外墙保温完成20%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成60%，
景观完成49%



地下

地库二遍腻子完成60%，顶棚涂料完成
95%，水泥固化地坪完成30%，桥架安
装72%，消防通风管安装60%

