

空港绿地新城六期项目进度（6月26日）

1 号楼（6F）

玻璃安装完成25%，外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成，挂板完成60%，公区装修完成20%，室外热力管道完成，消防环路基层完成70%。



4 号楼（6F）

窗框完成，外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成56%，挂板完成35%，大堂干挂龙骨完成，室外电力、热力管网完成。



8 号楼（6F）

玻璃安装完成15%，外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成20%，公区干挂龙骨完成，室外小市政管网完成。




12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板钢架完成95%，室内墙地砖完成96%，涂料完成，户内门完成，铝扣板完成，橱柜完成，卫浴柜完成，公区装修完成，一层大堂贴砖、吊顶完成，进户门完成。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门完成，橱柜、浴柜完成，进户门安装完成。

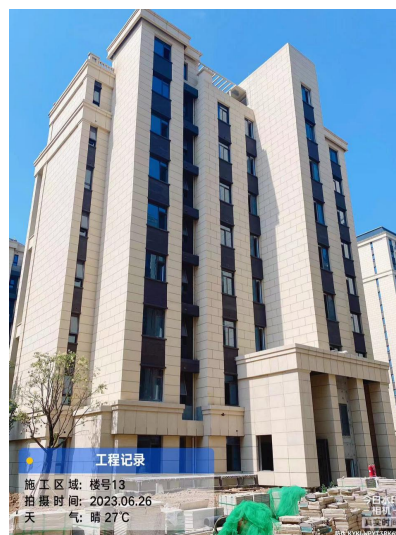

14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，一体板完成10%，户内墙地砖完成，吊顶、腻子完成，窗台石安装完成，公区地砖及腻子完成。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成，挂板完成20%，室内墙地砖完成96%，涂料完成，户内门安装完成，铝扣板完成，橱柜、浴柜安装完成，入户门安装完成。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成，玻璃安装完成95%，户内贴砖及涂料完成，户内门完成，铝扣板完成，橱柜、浴柜安装完成，进户门安装完成。



17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，室内及公区贴砖完成，吊顶完成，腻子完成70%。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成70%，
户内吊顶、腻子完成，贴砖完成，
窗台板完成90%，公区贴砖完成。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装
完成，一体板钢架完成，挂板完成23%，
户内贴砖、涂料完成，吊顶扣板完成，
户内门安装完成，木地板完成，橱柜、
浴柜安装完成，进户门安装完成，一层
大堂精装完成30%。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装
完成，一体板钢架完成35%，室内贴砖完
成，二遍腻子完成，涂料完成95%，一层
大堂精装完成90%。



21 号楼（15F）

外墙保温完成98%，真石漆完成50%，东单元墙面找平完成，吊顶封板完成，厨卫贴砖完成90%，西单元墙面找平完成，吊顶封板完成95%，厨卫贴砖完成40%。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成90%，二批次景观路硬化完成85%，东入口挡墙及台阶、水景结构完成。



地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成90%，顶棚涂料完成，地坪完成95%，划线完成80%，机电桥架安装90%，消防通风管安装85%，消防水安装完成80%。

