

空港绿地新城四期项目进度（8月1日）

1 号楼（15F）

玻璃安装完成90%，防火门框安装完成，外保温完成97%，外墙真石漆完成92%，一体板完成80%，屋面瓦完成，吊顶完成95%，腻子完成90%，贴砖完成，卧室地面找平完成，新风安装完成，进户门安装完成，橱柜浴室柜淋浴屏安装完成10%。



6 号楼（15F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成93%，屋面瓦完成，玻璃完成95%，墙地砖完成，新风安装完成，吊顶完成，腻子完成，乳胶漆完成75%，卧室地面找平完成，橱柜、浴室柜安装完成，户内门安装完成70%，进户门安装完成，淋浴屏安装完成。



9 号楼（17F）

外保温完成96%，外墙真石漆完成92%，
防火门框安装完成，屋面瓦完成，一体
板完成96%，玻璃安装完成90%，墙体找平
完成，吊顶完成80%，墙地砖铺贴完成83%，
新风安装完成。



12 号楼（17F）

玻璃安装完成90%，外墙保温完成96%，
真石漆完成94%，一体板完成94%，屋
面瓦完成，墙地砖完成，吊顶完成，
腻子完成，地面找平完成，新风系统
安装完成，进户门安装完成，橱柜浴室
柜开始安装。



14 号楼（18F）

外墙真石漆完成95%，一体板完成95%，
乳胶漆完成，玻璃安装完成95%，橱柜、
浴室柜完成，户内门安装完成95%，
空调安装完成，木地板安装完成，
新风安装完成，淋浴屏安装完成，进户
门安装完成，精保洁完成50%。




15 号楼（18F）

玻璃安装完成85%，外保温完成95%，
外墙真石漆完成90%，屋面瓦完成，
墙体找平完成，吊顶完成85%，地面
找平完成90%，墙地面贴砖完成83%，
橱柜浴室柜进场上楼。



16 号楼（17F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，
一体板完成92%，新风系统安装完成，
吊顶完成，墙面找平完成，玻璃安
装完成96%，地砖完成，腻子完成，
乳胶漆完成92%，屋面瓦完成，橱柜
浴室柜安装完成，户内门安装完成90%，
淋浴屏安装完成80%，木地板完成，进
户门安装完成。

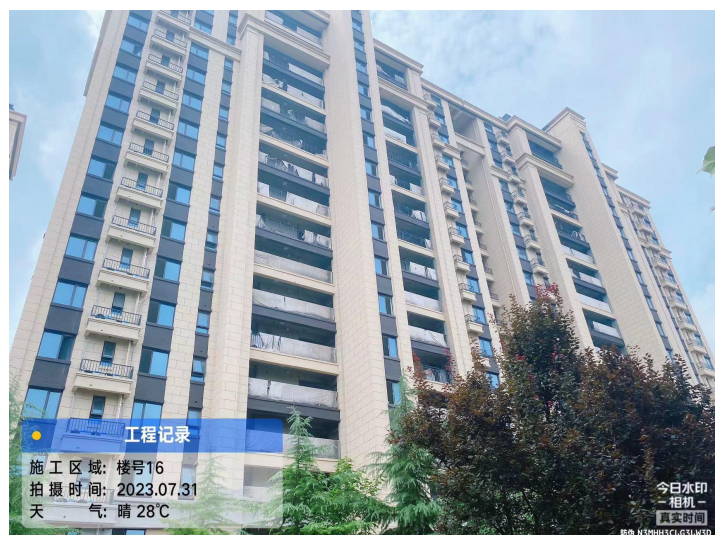

室外

土方回填完成，围墙完成，小市政完成95%，二批次景观扑救面完成90%，铺装完成40%，地形完成60%，绿化完成30%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成92%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成90%。

