

空港绿地新城六期项目进度（8月8日）

1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成25%，一体板挂板完成88%，公区墙地砖完成96%，室外管网完成，天然气中压完成，消防环路基层完成90%。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成15%，一体板挂板完成70%，公区墙砖完成85%，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成85%。



8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成45%，挂板完成30%，玻璃安装完成15%，公区干挂墙砖完成30%，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成80%。




12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板挂板完成83%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门完成，木地板、踢脚线、橱柜、浴柜、淋浴屏完成，进户门完成，马桶安装完成，开关插座完成40%，空调安装中，一遍精保洁完成，油烟机安装中。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门完成，木地板、踢脚线、橱柜、浴柜、淋浴屏完成，进户门安装完成，马桶安装完成，开关插座完成42%，空调安装中，一遍精保洁完成，油烟机安装中。

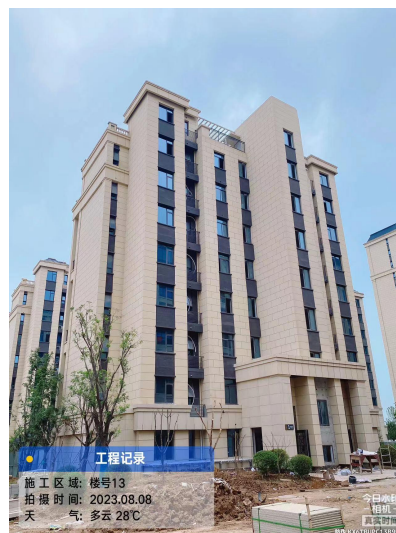

14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成50%，一体板钢架完成93%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子、窗台石安装完成，东单元腻子修补打磨70%，橱柜、户内门材料到场，入户门安装30%。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板挂板完成88%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门安装完成，橱柜、浴柜、淋浴屏安装完成，木地板、踢脚线完成，入户门安装完成，马桶安装完成，空调安装中，一遍精保洁完成，油烟机安装中。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成98%，玻璃安装完成98%，室内及公区墙地砖、涂料完成，户内门完成，橱柜、浴柜、淋浴屏安装完成，木地板、踢脚线、进户门安装完成，马桶安装完成，空调安装中，一遍精保洁完成，油烟机安装中。




17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，室内及公区墙地砖完成，吊顶完成，二遍腻子完成，打磨完成50%，窗台石完成，淋浴隔断完成，橱柜、户内门材料到场。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、二遍腻子完成，涂料完成70%，扣板完成60%，窗台板完成，入户门安装完成95%，橱柜、户内门材料上料中。

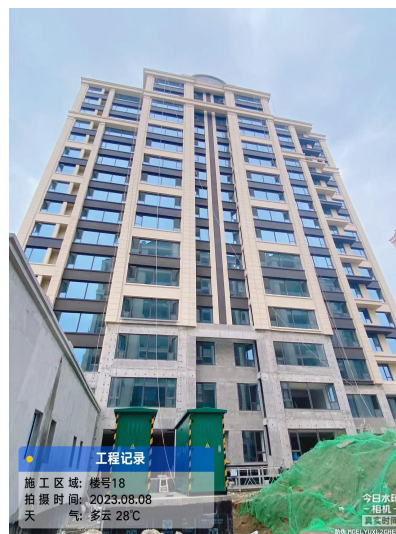

19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板挂板完成45%，室内墙地砖、吊顶、涂料完成，户内门、木地板踢脚线、橱柜、浴柜安装完成，开关插座完成，洁具安装完成，空调安装中，进户门安装完成，一层大堂墙地砖及吊顶完成，一遍精保洁完成，油烟机安装中。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成48%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门安装完成，木地板、橱柜、浴柜安装完成，台面安装完成，踢脚线完成98%，浴霸，洁具安装中，一层大堂精装完成，油烟机安装中。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，东单元吊顶、腻子完成，墙地砖完成，西单元吊顶完成，二遍腻子完成95%，墙地砖完成，一层大堂贴砖完成40%，橱柜、户内门材料到场。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成90%，东入口挡墙及台阶、水景结构完成，西入口水景及景观亭基础施工完成，主体结构、绿化堆坡塑形施工中。



地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成97%，顶棚涂料完成，地坪完成97%，划线完成80%，机电桥架安装94%，消防通风管安装92%，消防水安装完成92%。

